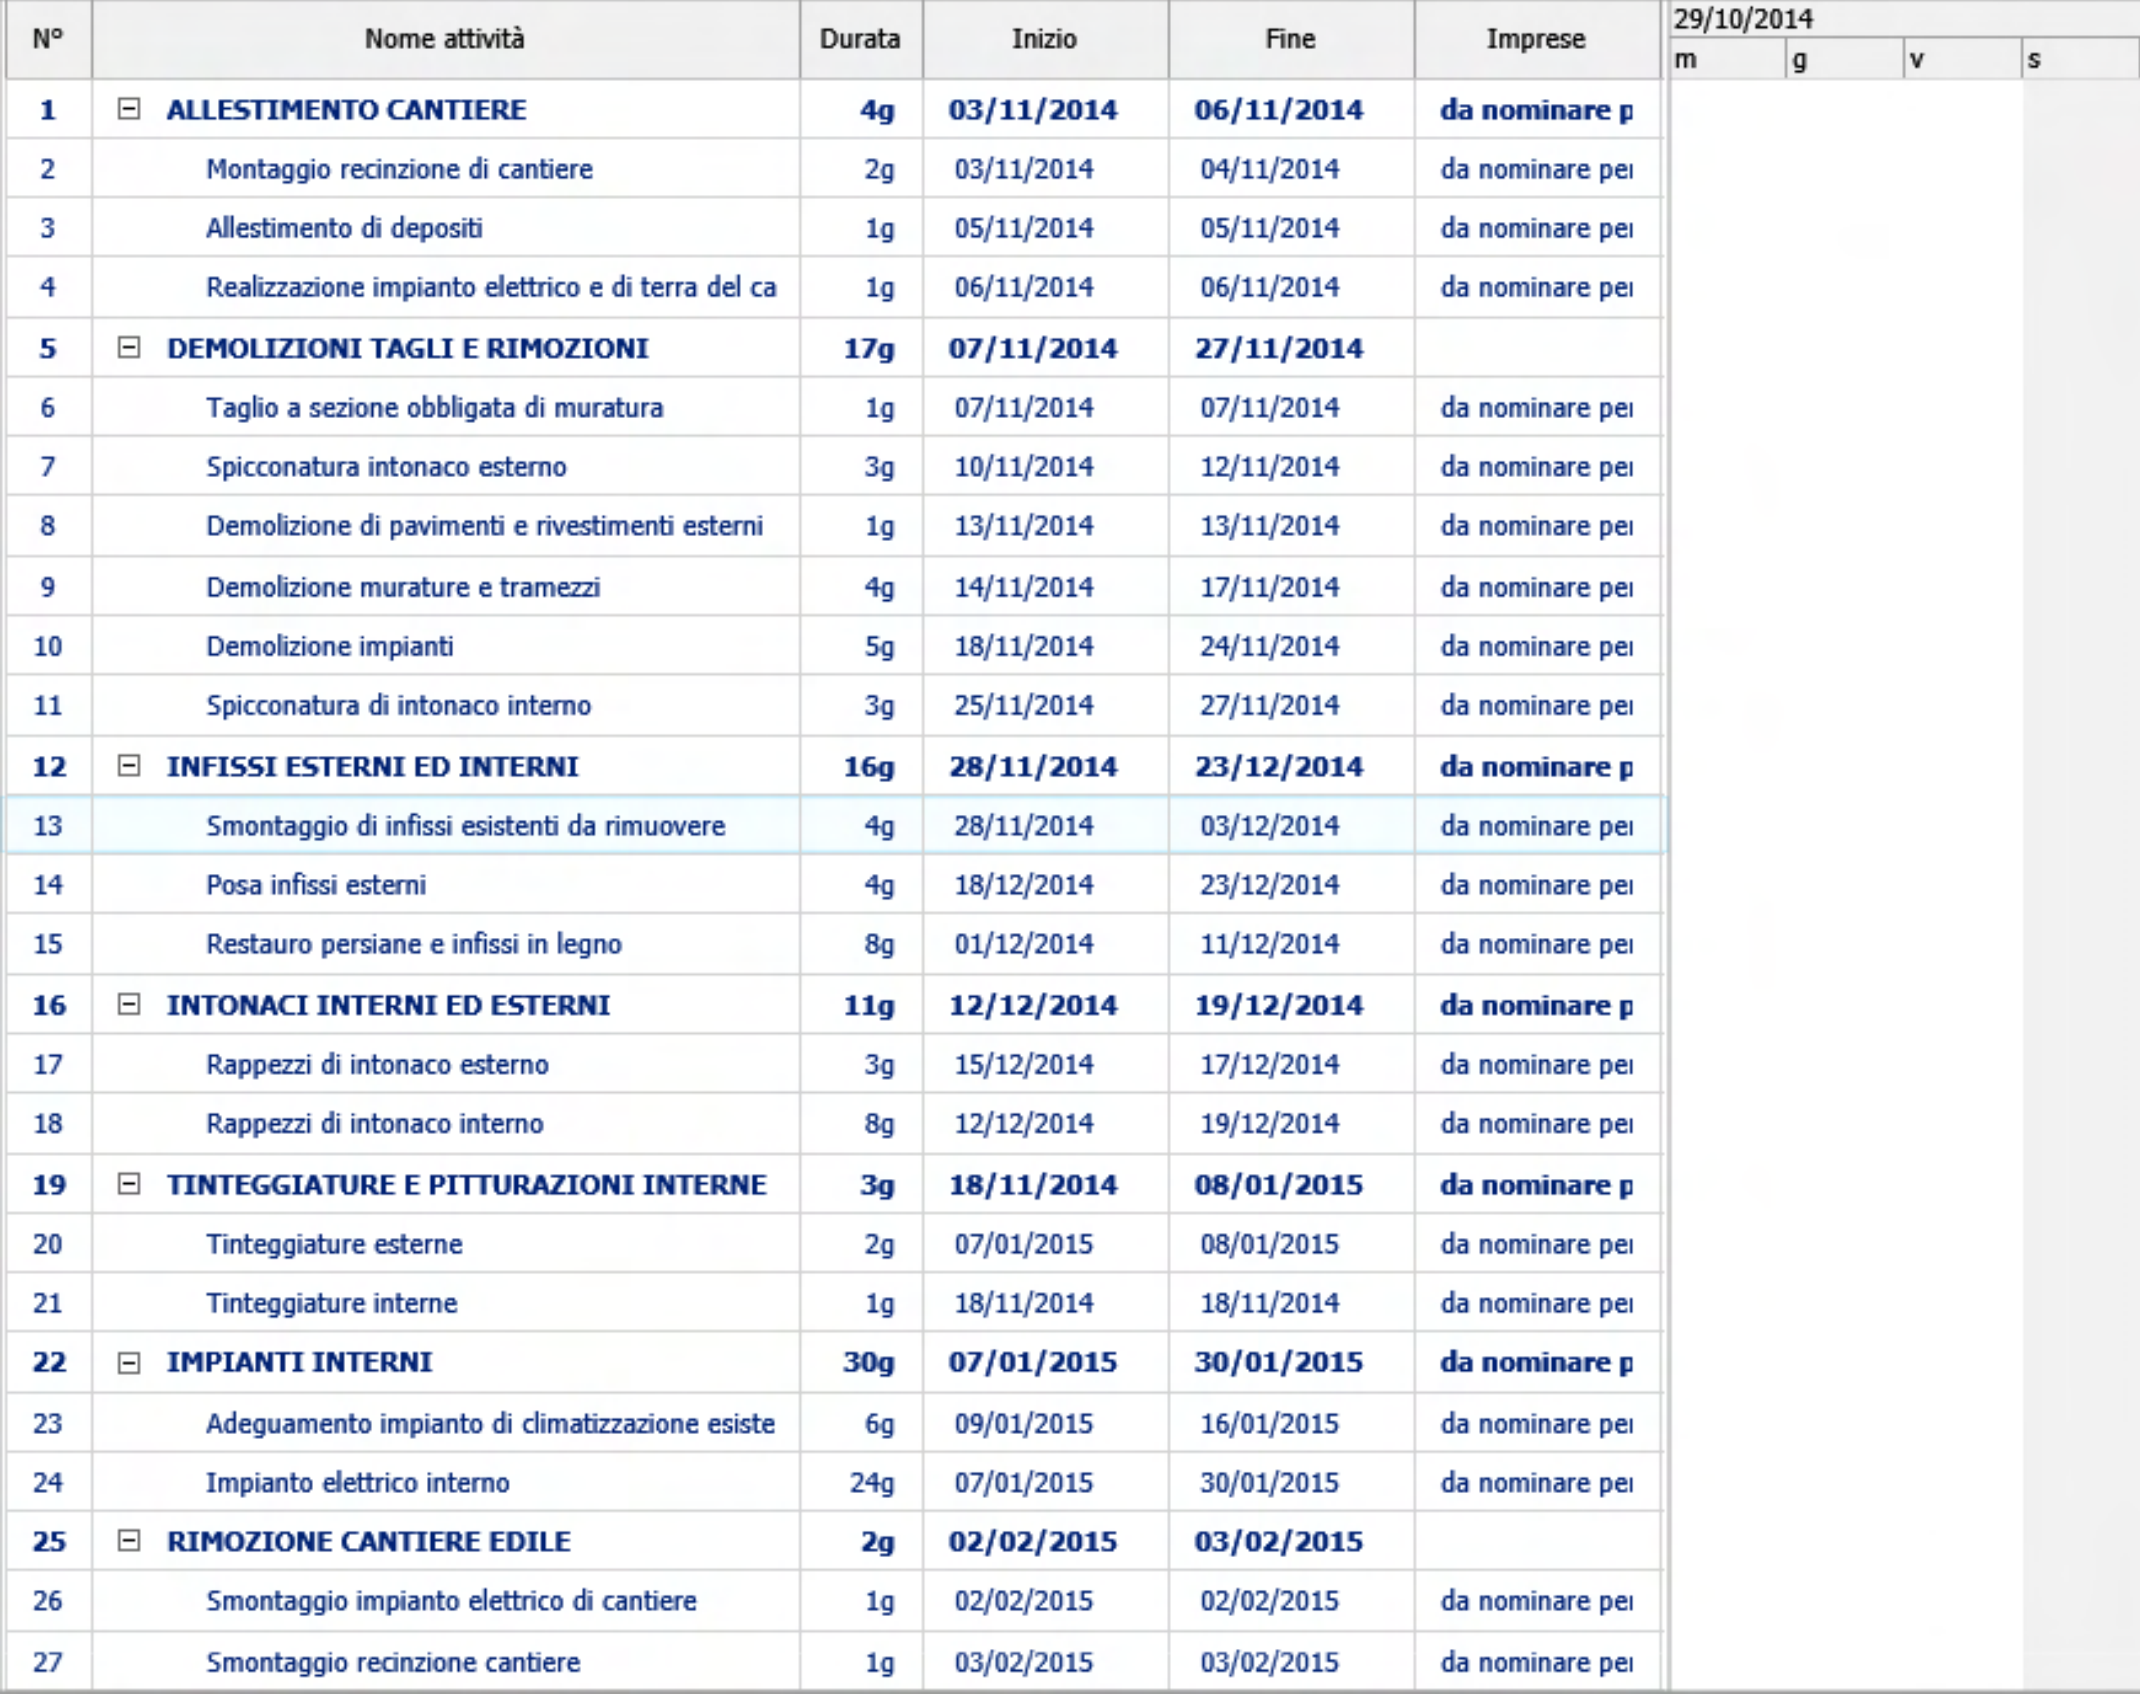

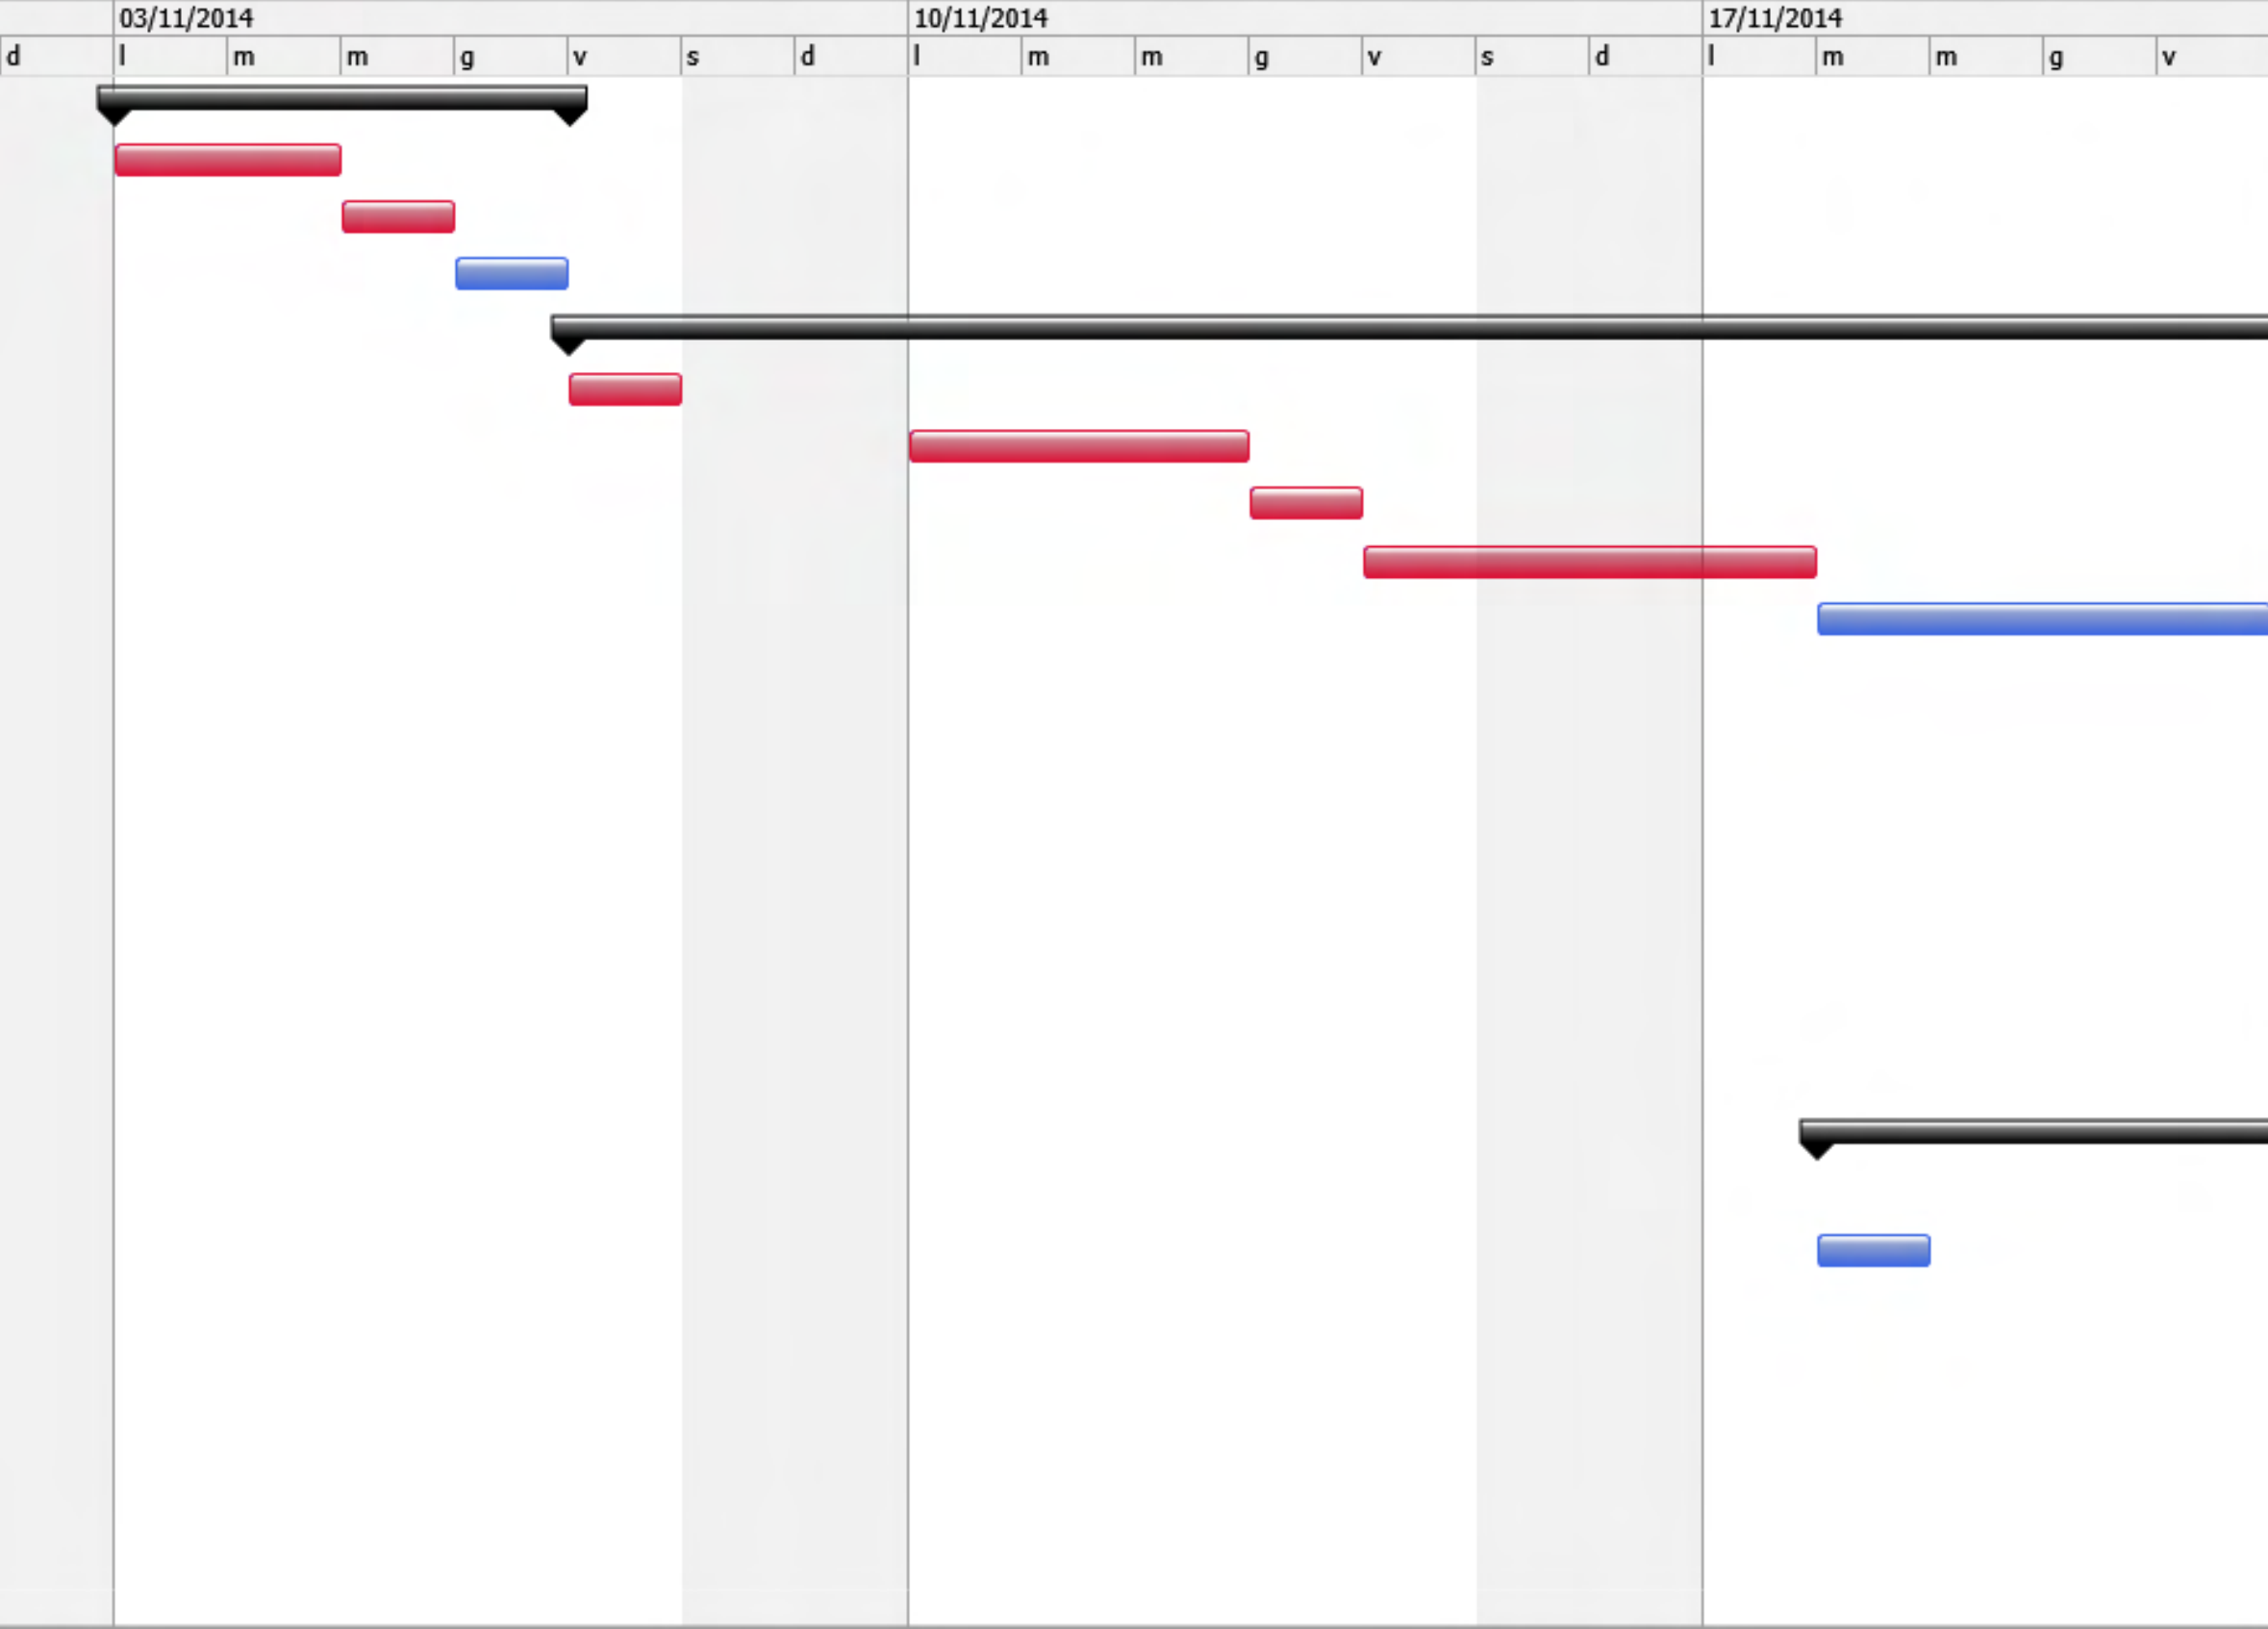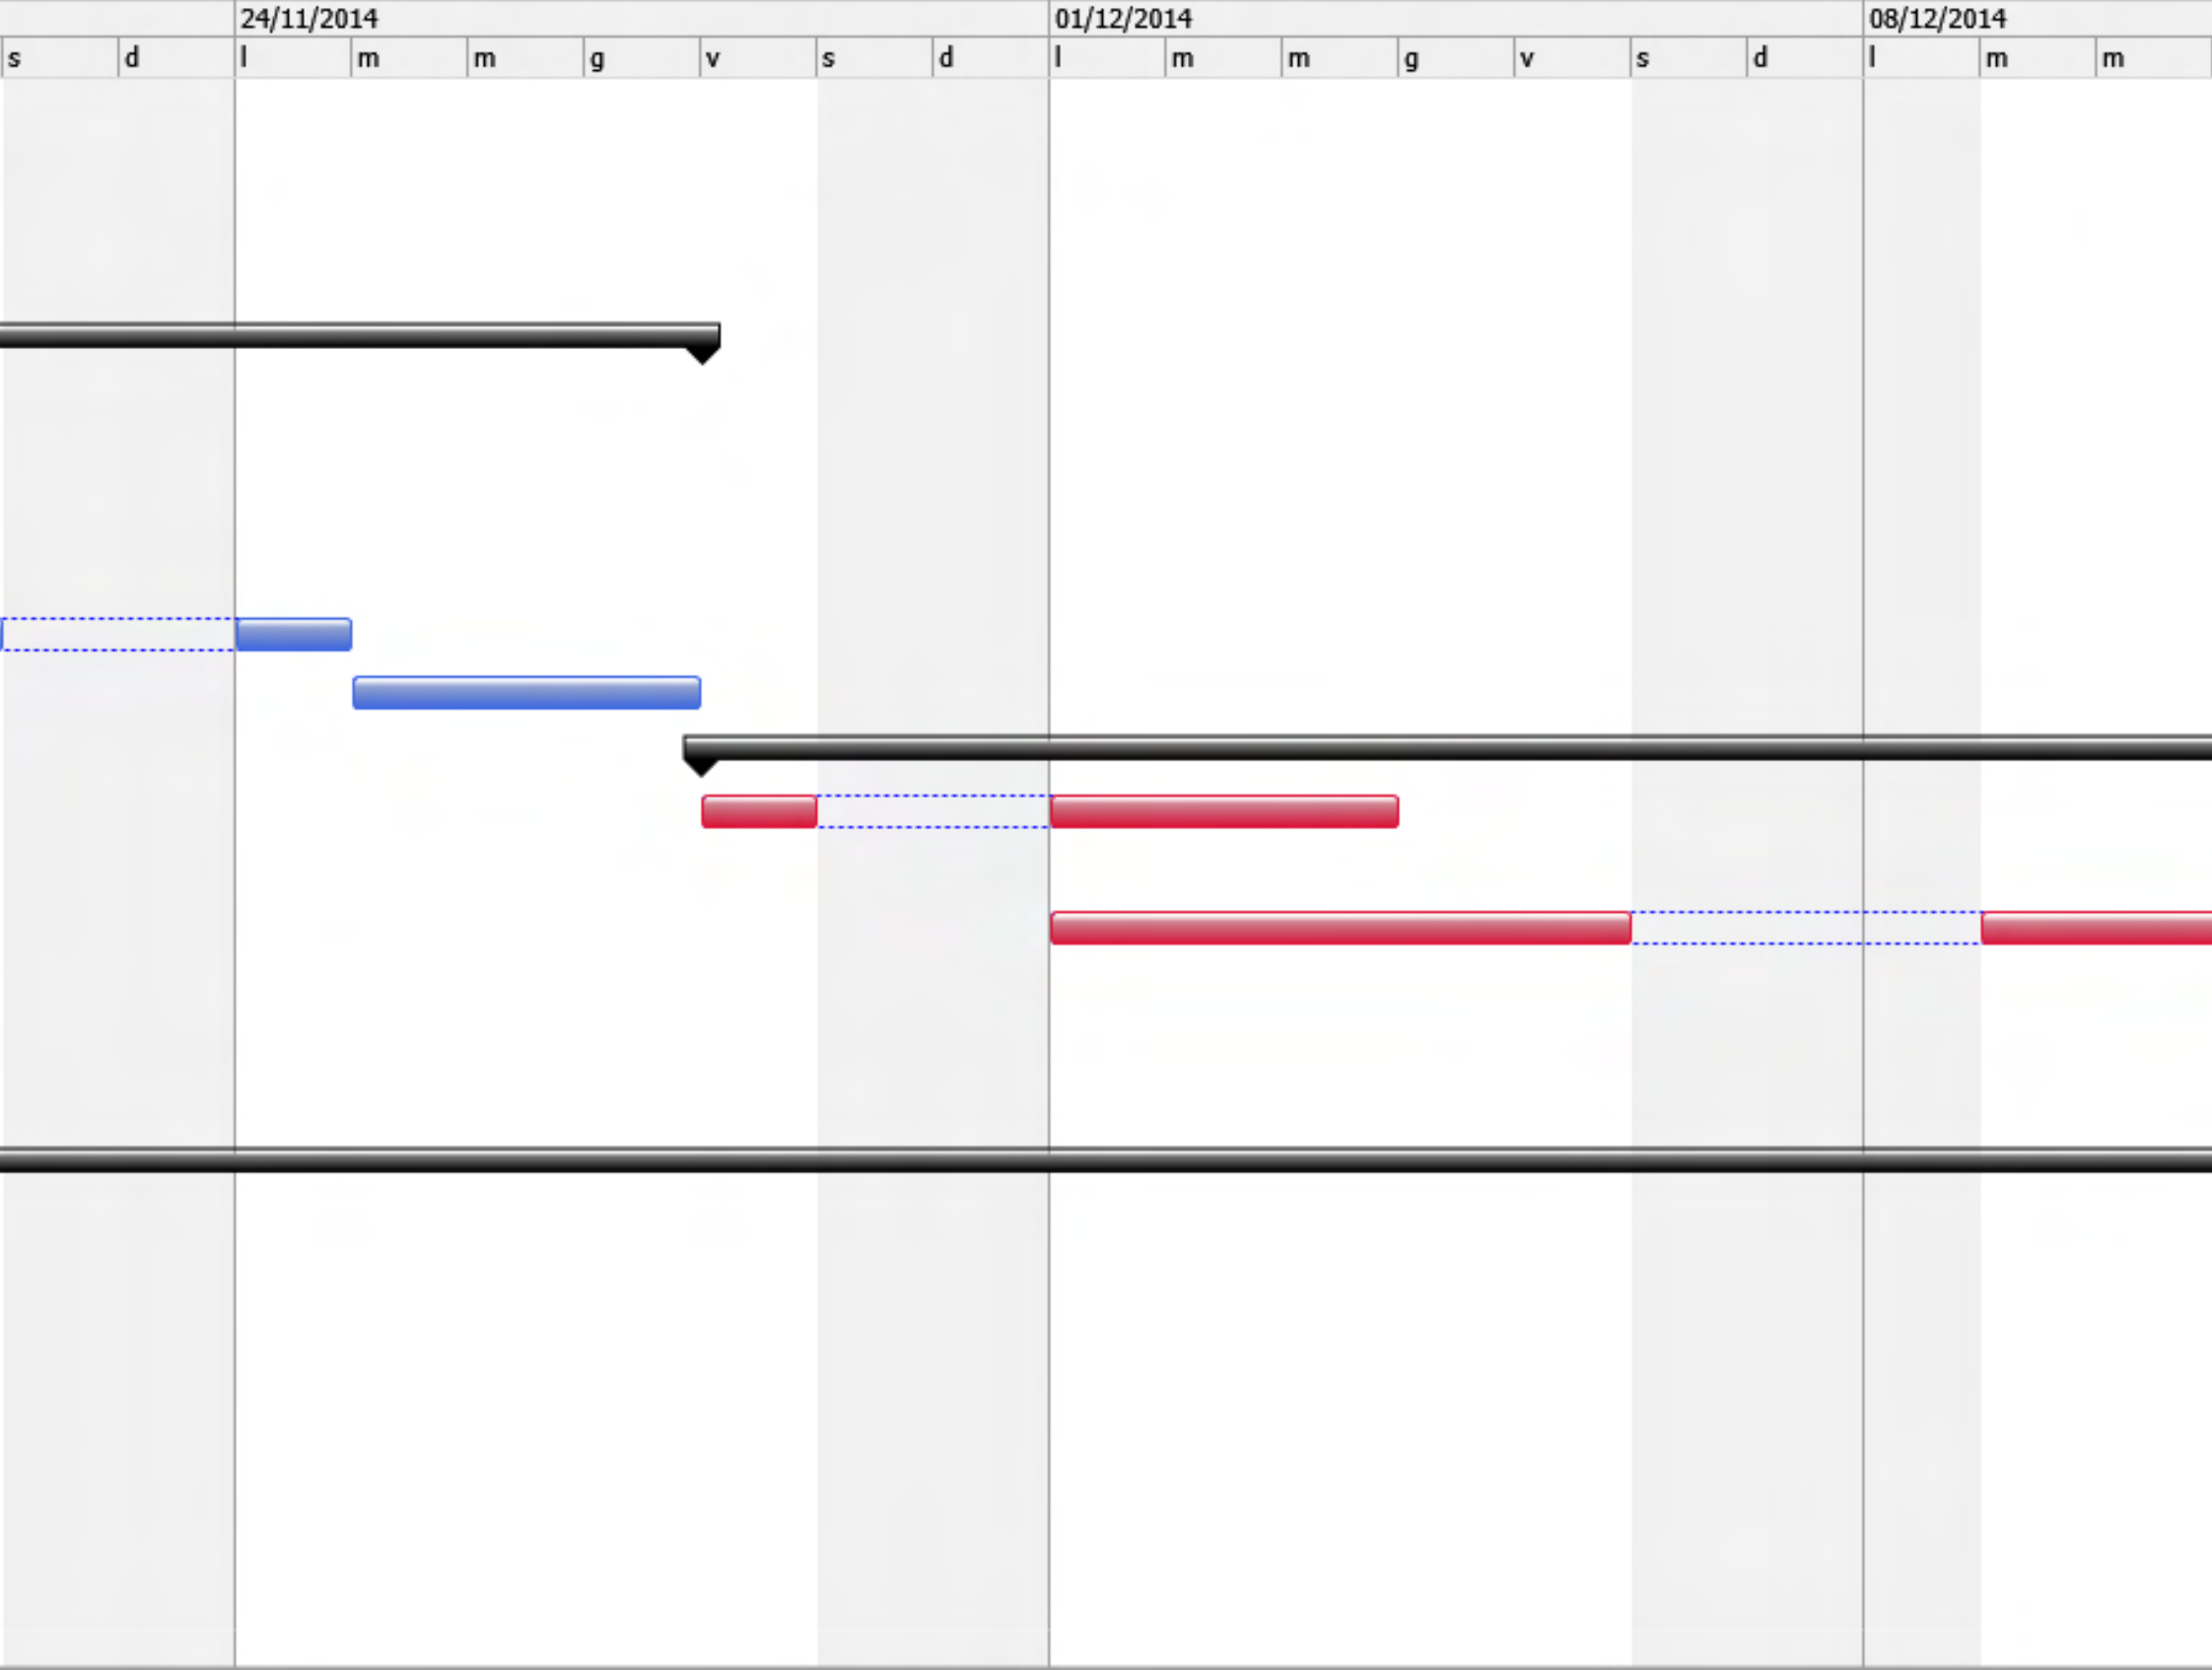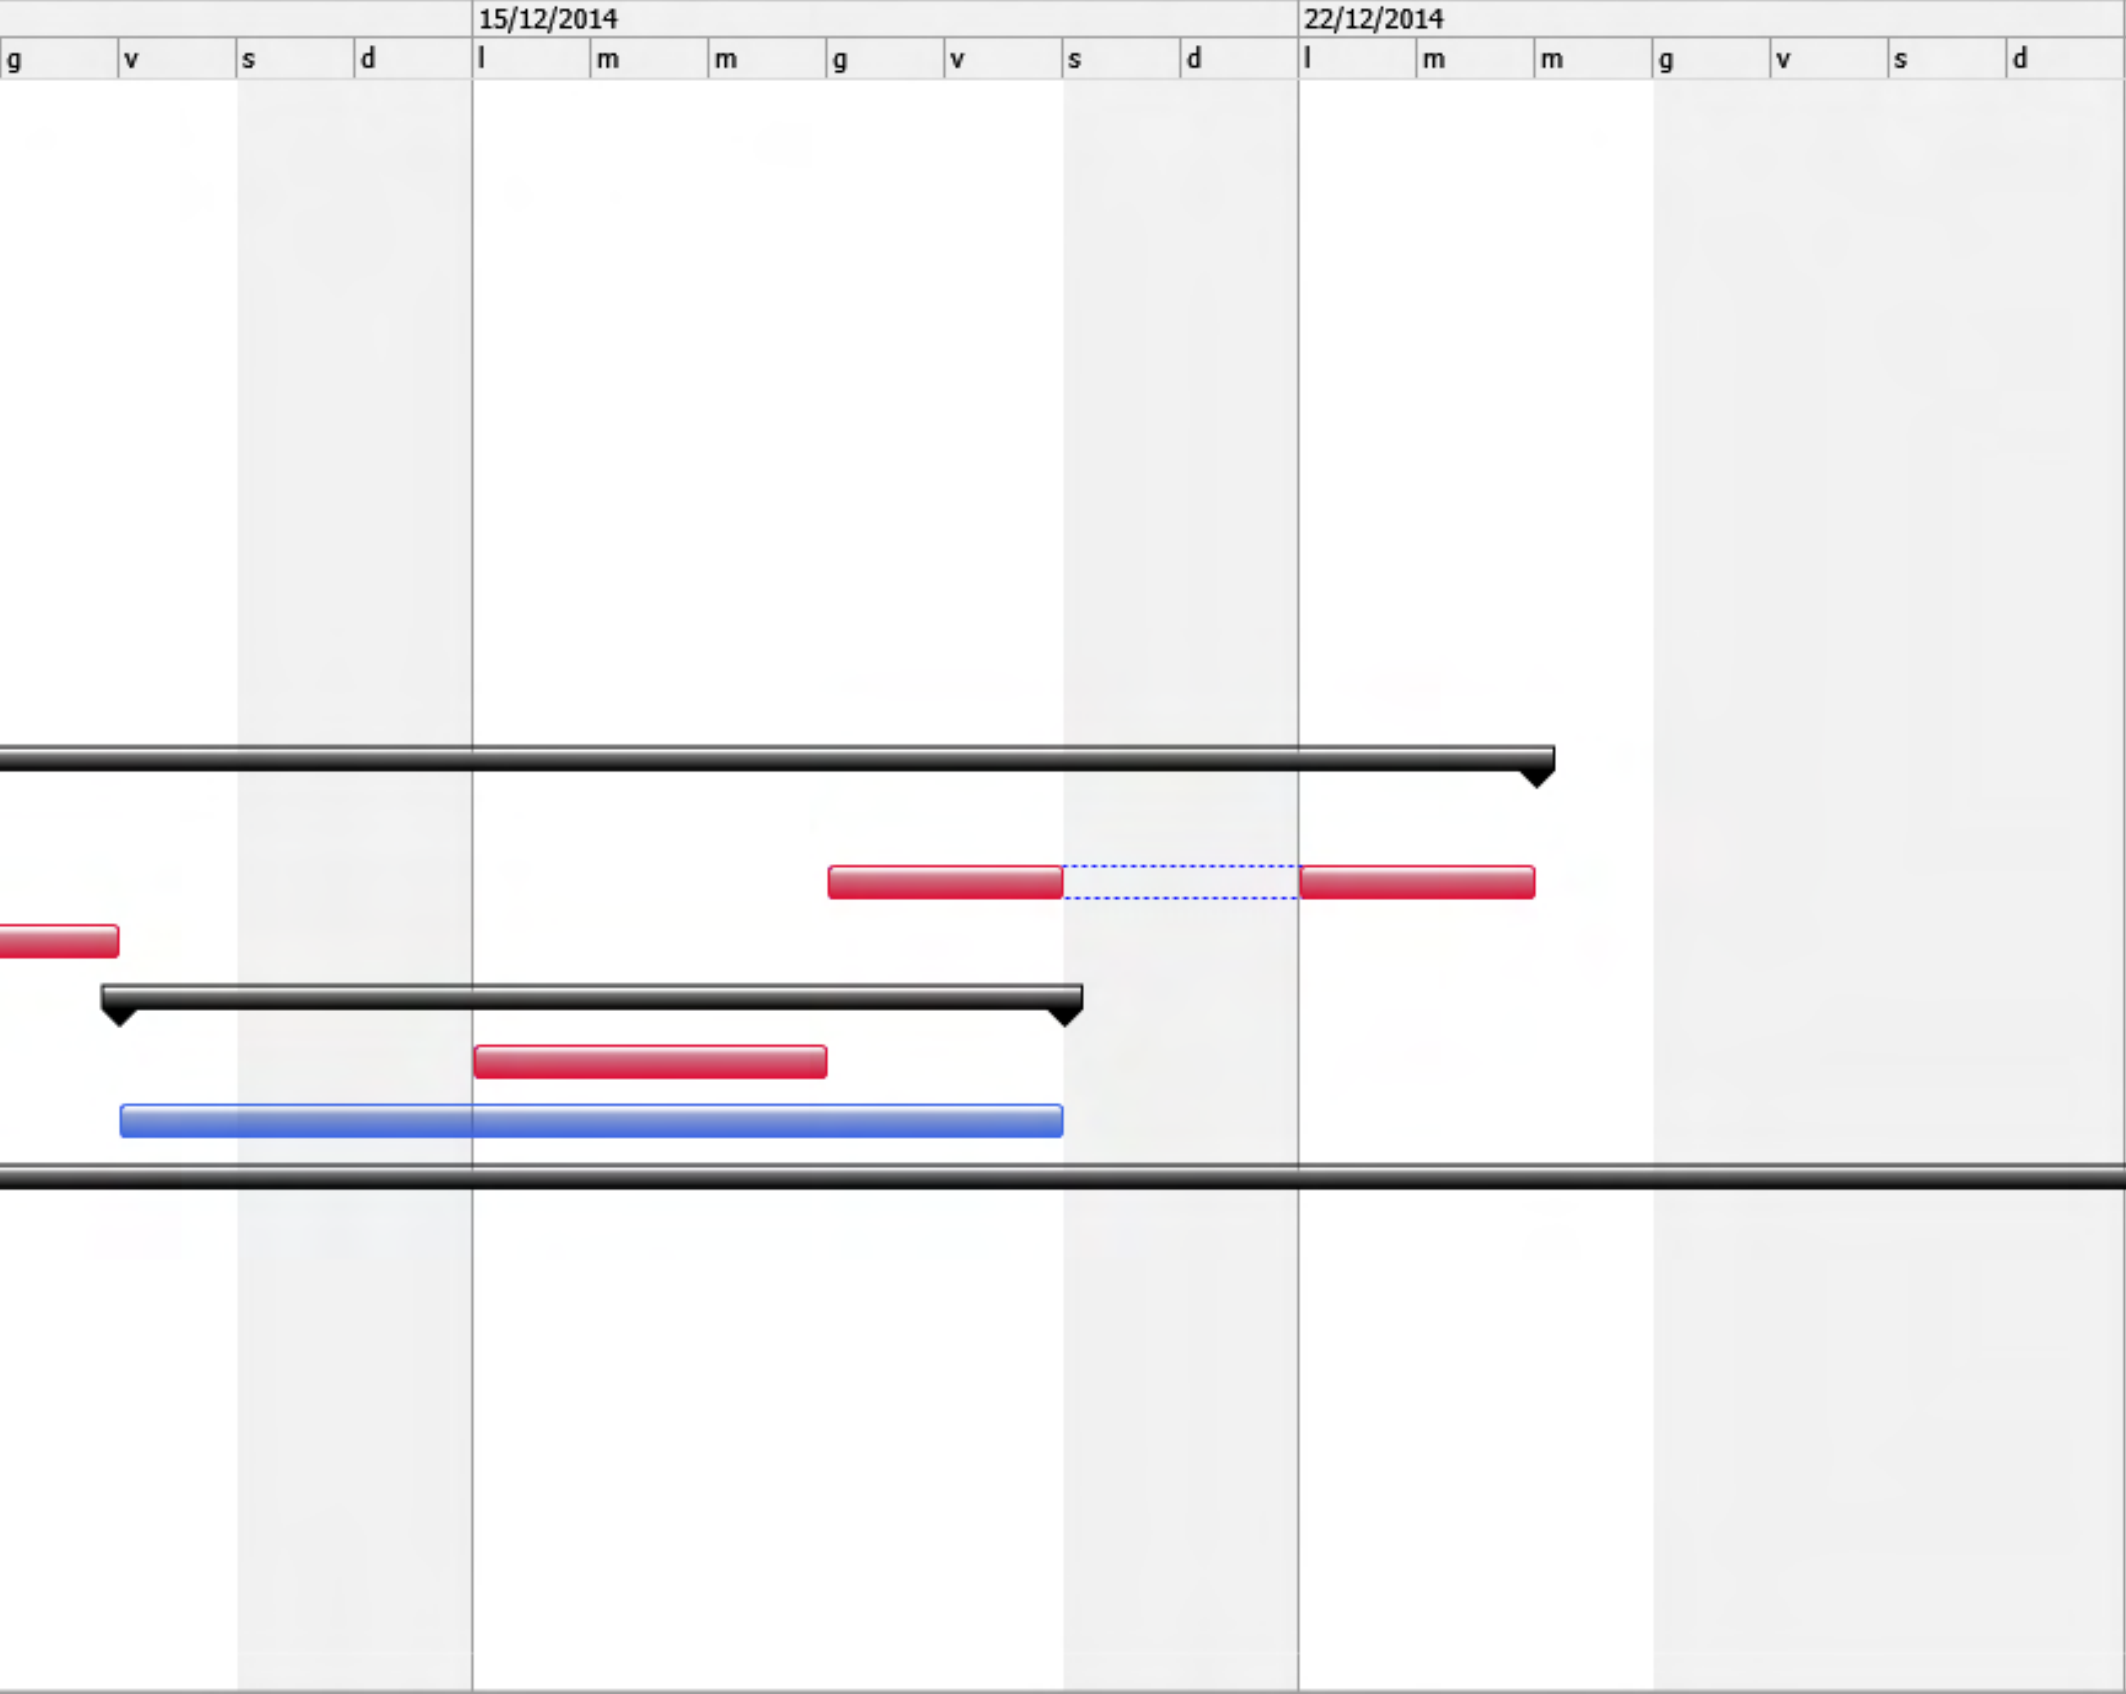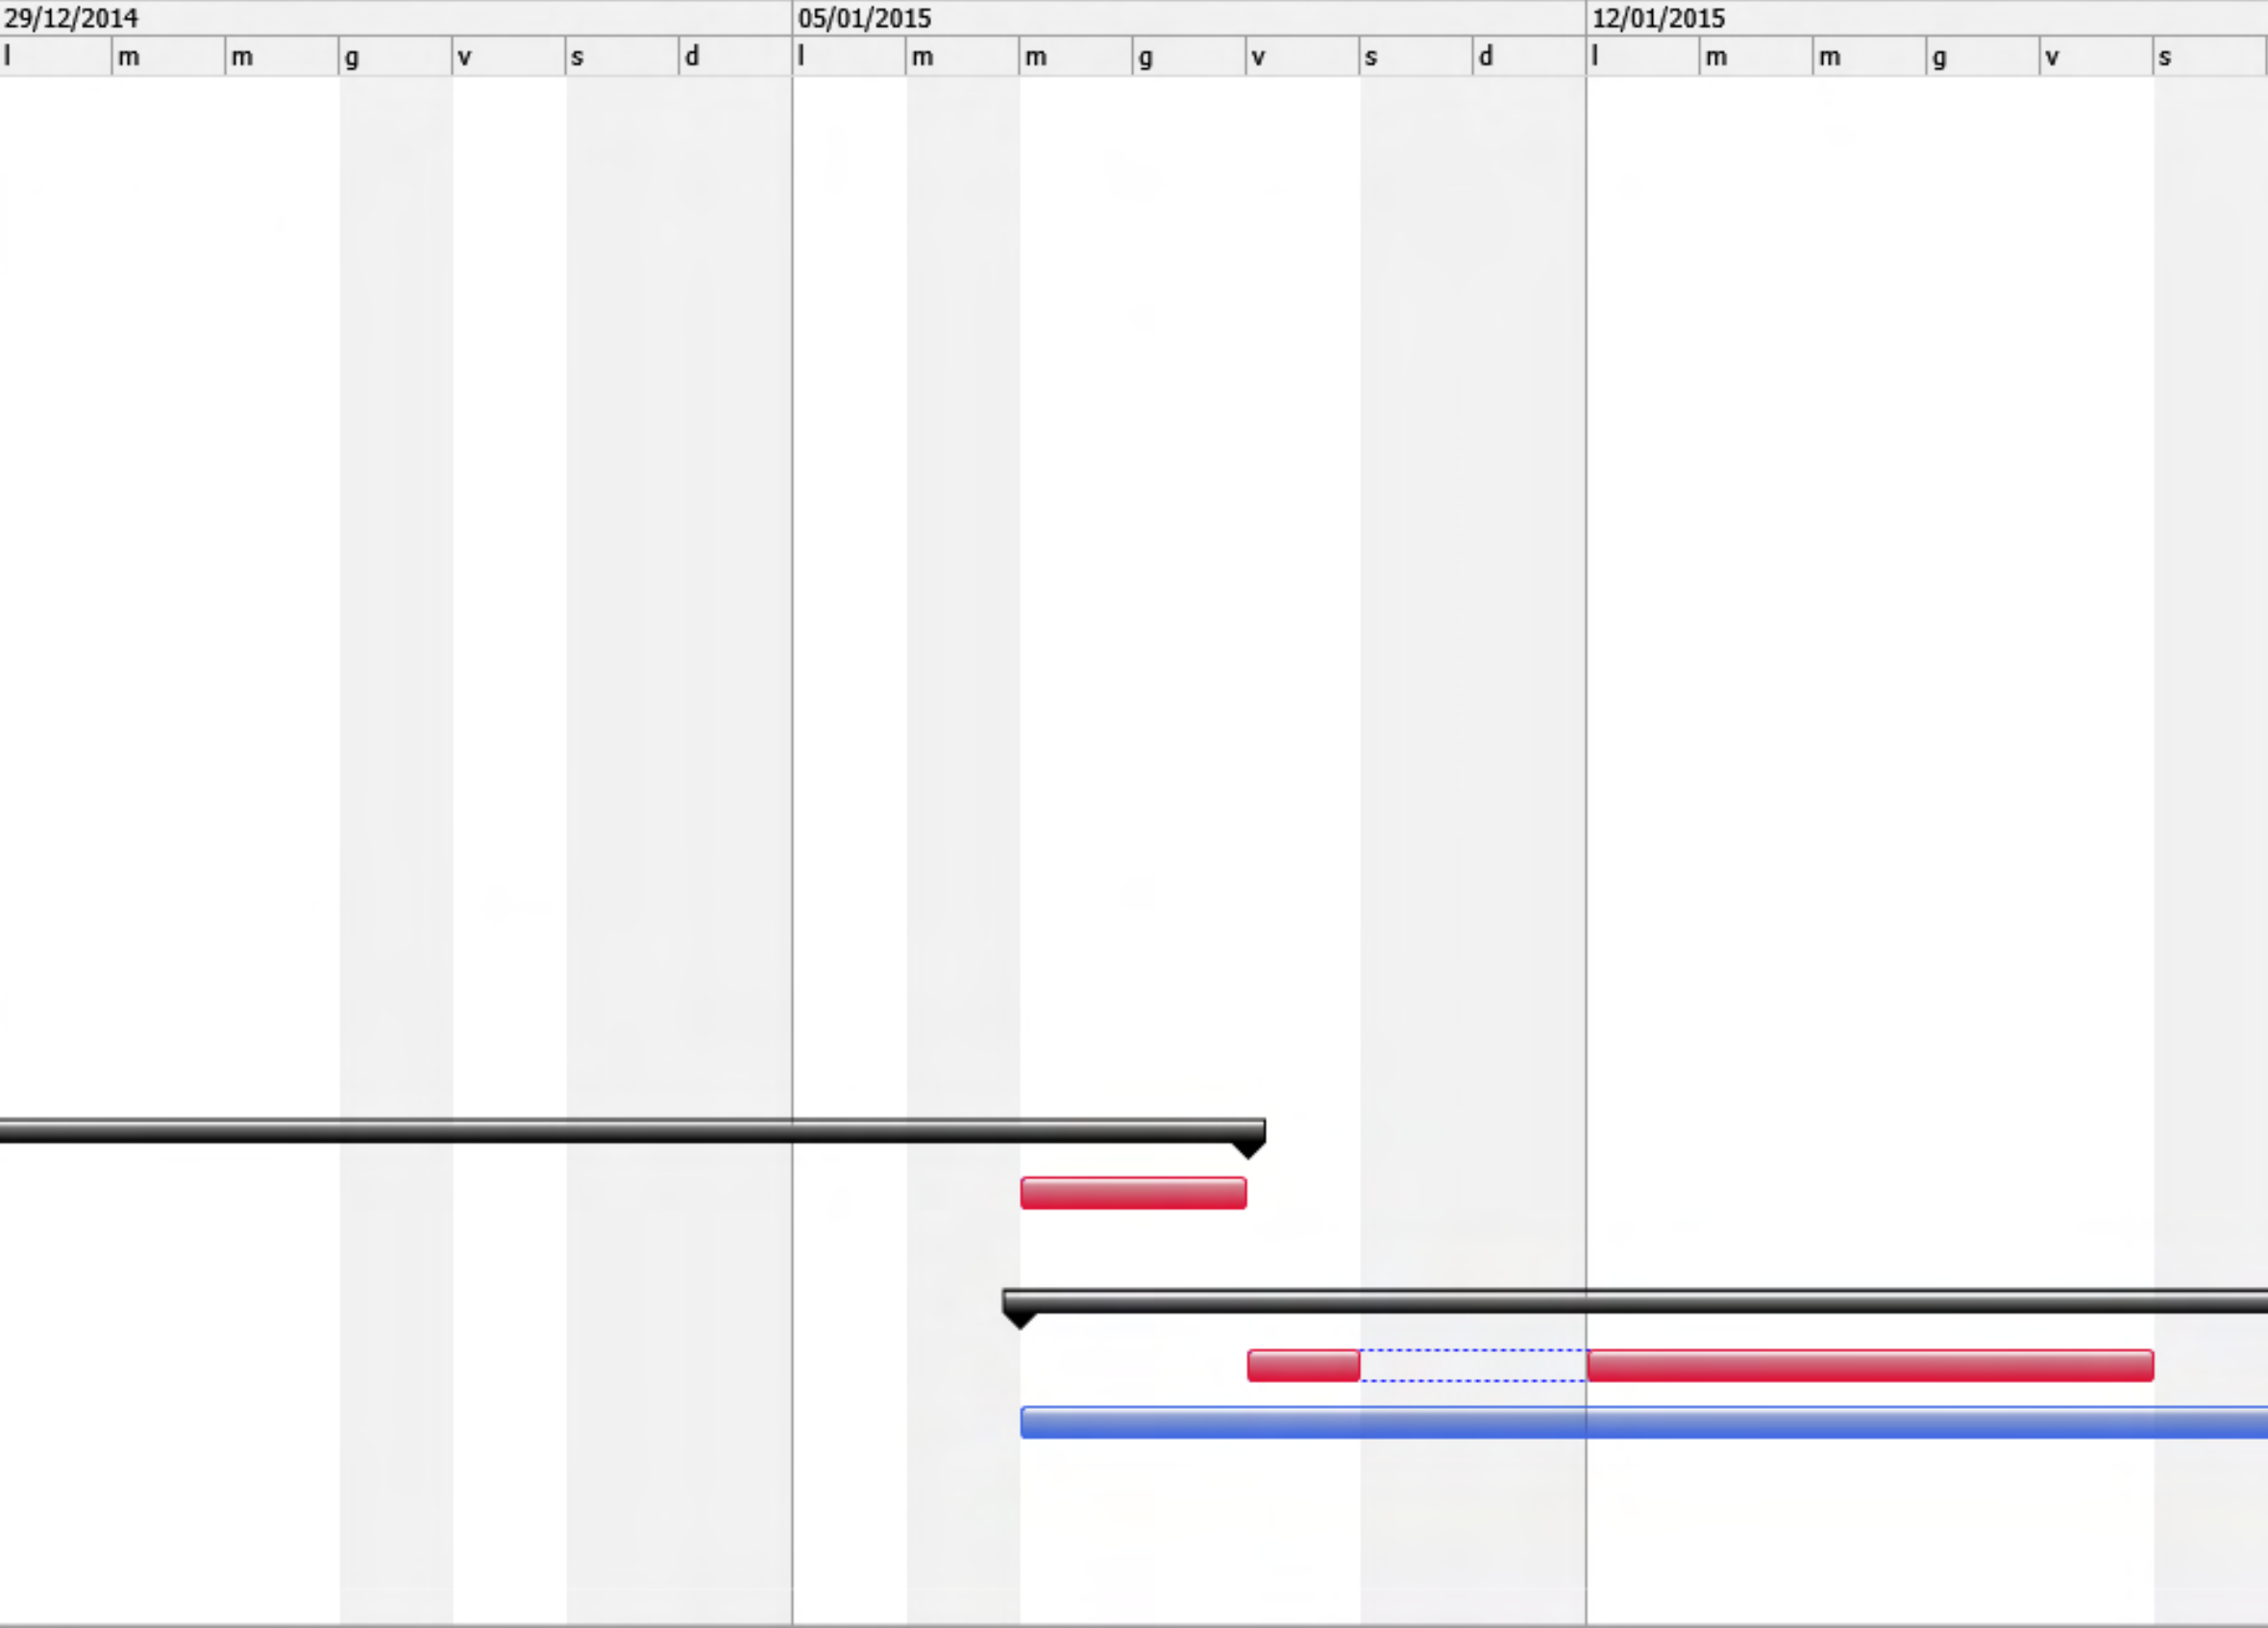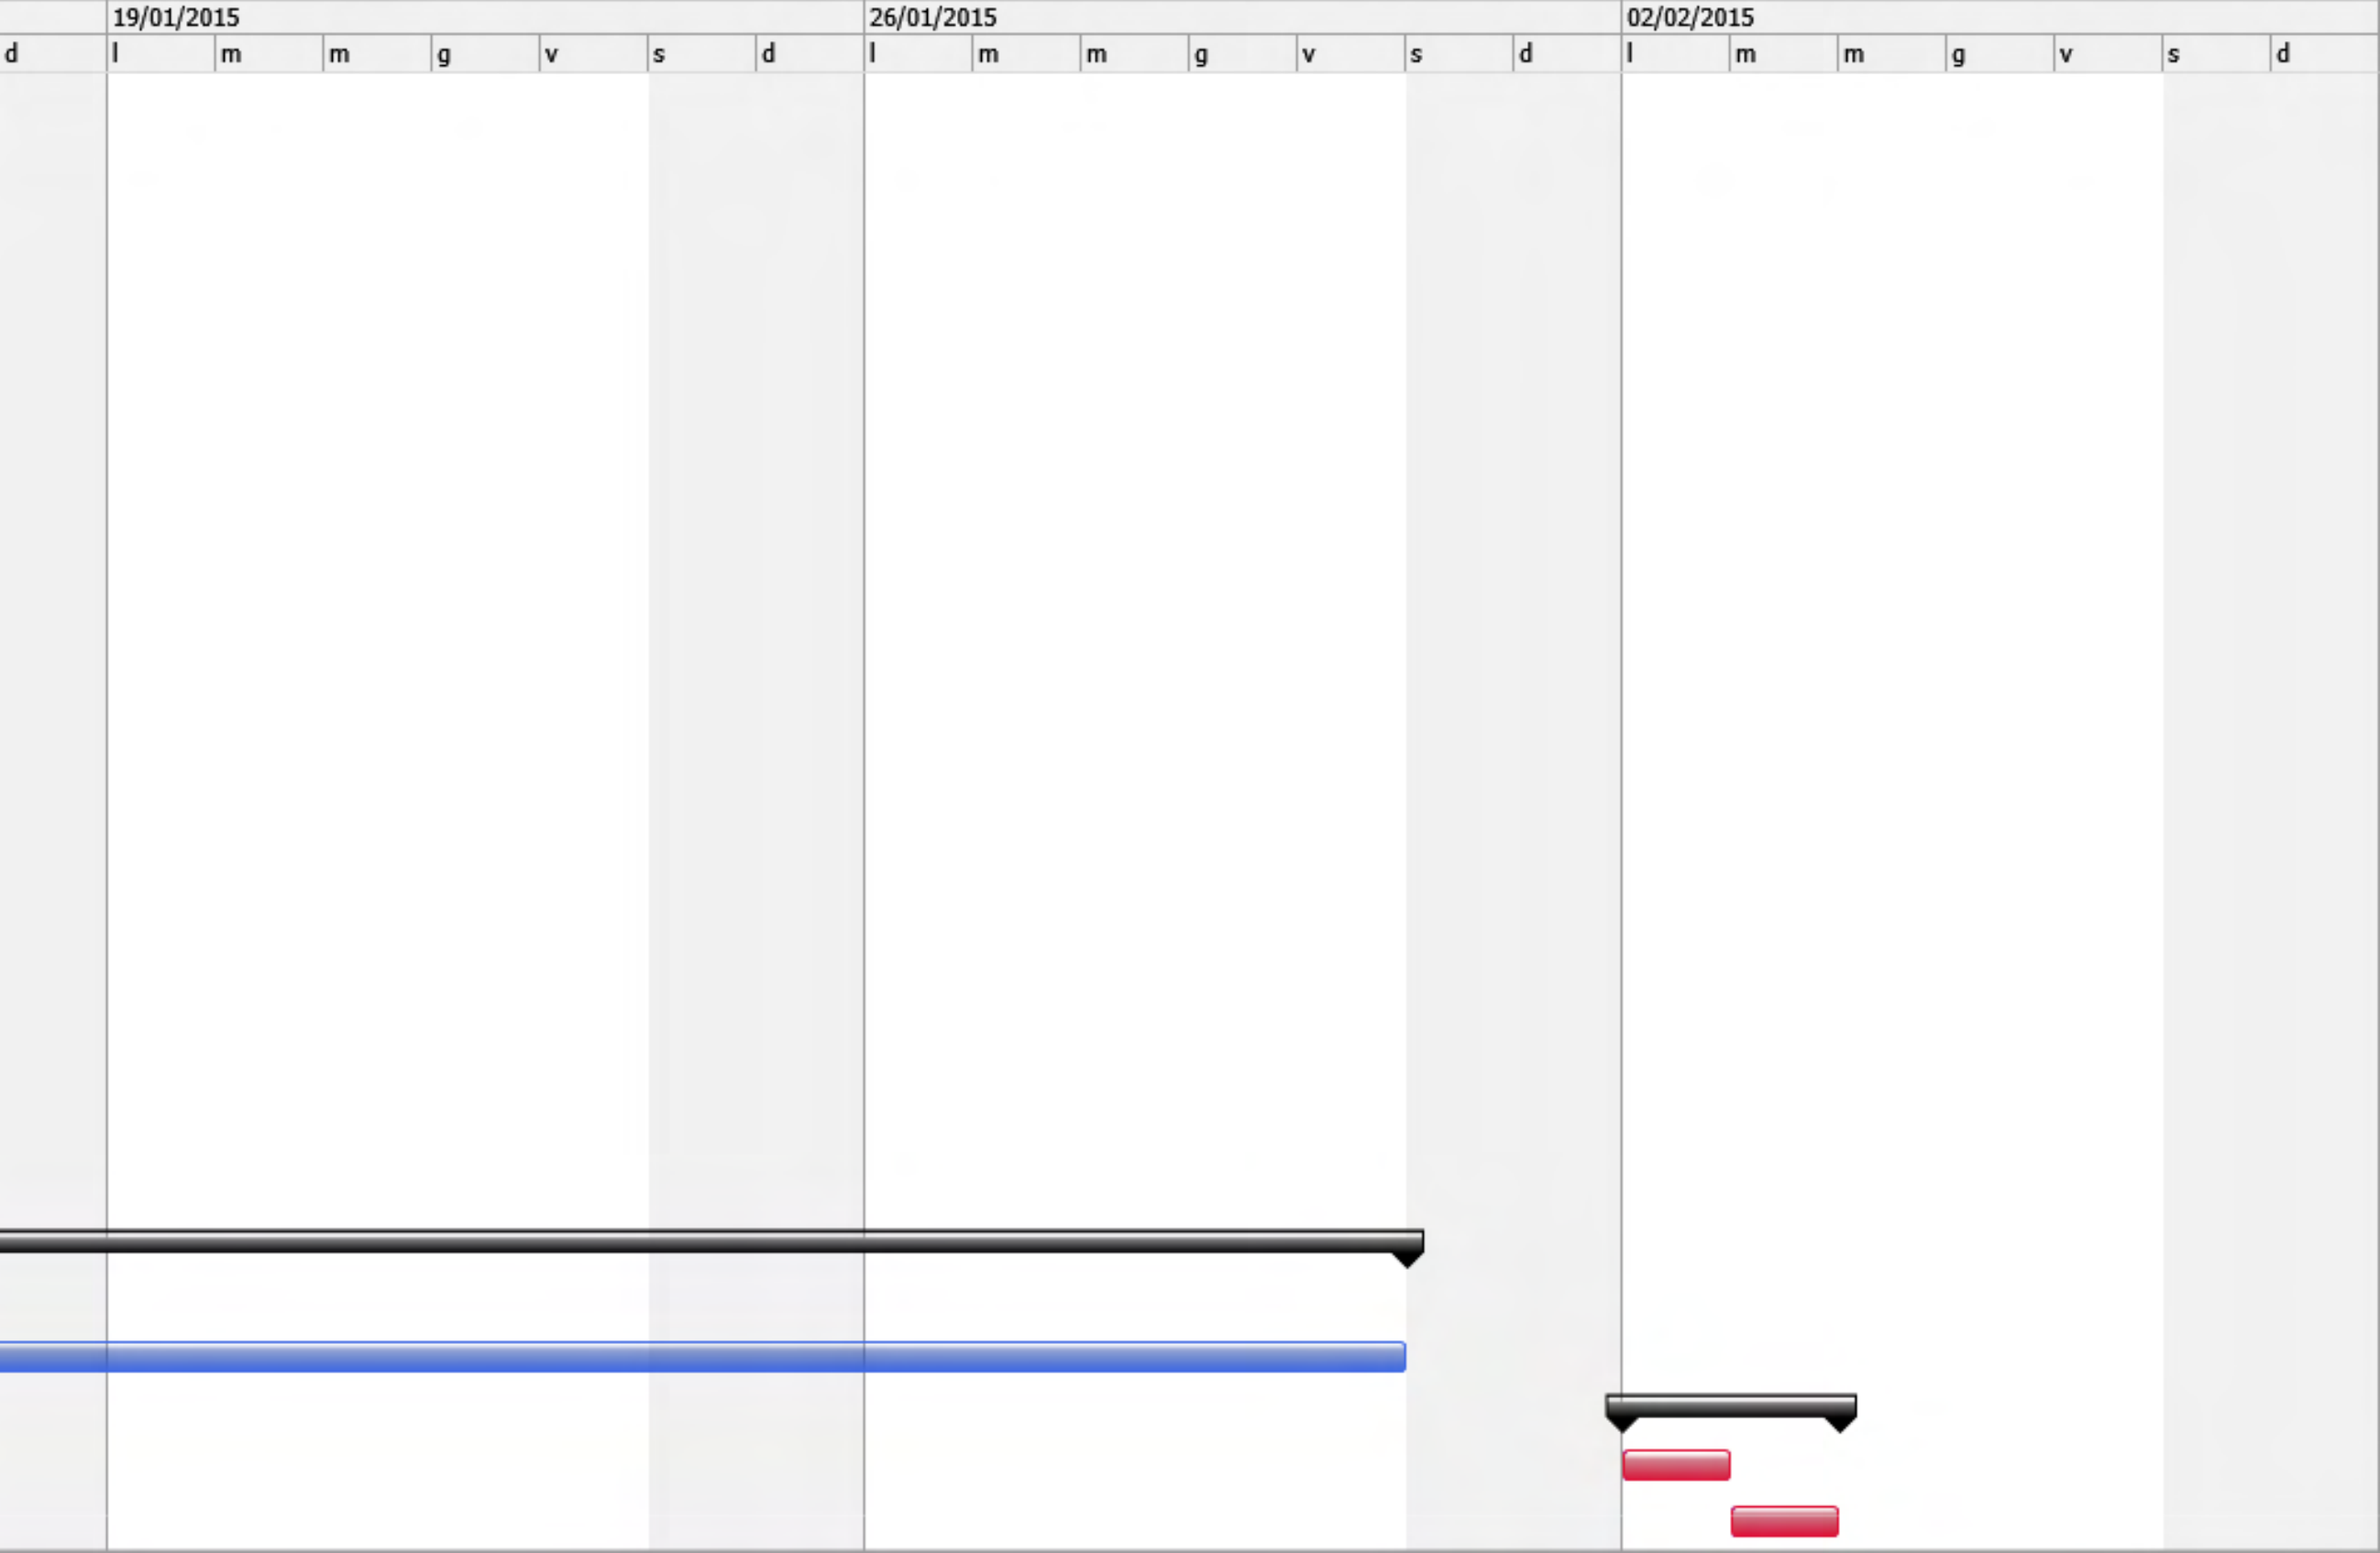N°		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Imprese
1	⊟	**ALLESTIMENTO CANTIERE**	**4g**	**03/11/2014**	**06/11/2014**	**da nominare p**
2		Montaggio recinzione di cantiere	2g	03/11/2014	04/11/2014	da nominare pe
3		Allestimento di depositi	1g	05/11/2014	05/11/2014	da nominare pe
4		Realizzazione impianto elettrico e di terra del ca	1g	06/11/2014	06/11/2014	da nominare pe
5	⊟	**DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI**	**17g**	**07/11/2014**	**27/11/2014**	
6		Taglio a sezione obbligata di muratura	1g	07/11/2014	07/11/2014	da nominare pe
7		Spicconatura intonaco esterno	3g	10/11/2014	12/11/2014	da nominare pe
8		Demolizione di pavimenti e rivestimenti esterni	1g	13/11/2014	13/11/2014	da nominare pe
9		Demolizione murature e tramezzi	4g	14/11/2014	17/11/2014	da nominare pe
10		Demolizione impianti	5g	18/11/2014	24/11/2014	da nominare pe
11		Spicconatura di intonaco interno	3g	25/11/2014	27/11/2014	da nominare pe
12	⊟	**INFISSI ESTERNI ED INTERNI**	**16g**	**28/11/2014**	**23/12/2014**	**da nominare p**
13		Smontaggio di infissi esistenti da rimuovere	4g	28/11/2014	03/12/2014	da nominare pe
14		Posa infissi esterni	4g	18/12/2014	23/12/2014	da nominare pe
15		Restauro persiane e infissi in legno	8g	01/12/2014	11/12/2014	da nominare pe
16	⊟	**INTONACI INTERNI ED ESTERNI**	**11g**	**12/12/2014**	**19/12/2014**	**da nominare p**
17		Rappezzi di intonaco esterno	3g	15/12/2014	17/12/2014	da nominare pe
18		Rappezzi di intonaco interno	8g	12/12/2014	19/12/2014	da nominare pe
19	⊟	**TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI INTERNE**	**3g**	**18/11/2014**	**08/01/2015**	**da nominare p**
20		Tinteggiature esterne	2g	07/01/2015	08/01/2015	da nominare pe
21		Tinteggiature interne	1g	18/11/2014	18/11/2014	da nominare pe
22	⊟	**IMPIANTI INTERNI**	**30g**	**07/01/2015**	**30/01/2015**	**da nominare p**
23		Adeguamento impianto di climatizzazione esiste	6g	09/01/2015	16/01/2015	da nominare pe
24		Impianto elettrico interno	24g	07/01/2015	30/01/2015	da nominare pe
25	⊟	**RIMOZIONE CANTIERE EDILE**	**2g**	**02/02/2015**	**03/02/2015**	
26		Smontaggio impianto elettrico di cantiere	1g	02/02/2015	02/02/2015	da nominare pe
27		Smontaggio recinzione cantiere	1g	03/02/2015	03/02/2015	da nominare pe
